

校区基建项目 工作简报



（2022 年第 5 期，总第 5 期）


中国石油大学（北京）克拉玛依校区校园管理部

2022 年 10 月 6 日


-
- 在建项目工程进度
 - 完工项目回访工作
 - 基本建设其他工作

一、在建项目工程进展

1. **C4 公共教学楼（政府代建）**：开工时间 **2020 年 7 月 8 日**，综合进度累计完成 **99%**。协调教（研）务部、科技与信息部相关设施设备的进场与安装，完善室外照明和场地硬化，按期于 8 月 29 日具备教学条件并投入使用。目前已完成场地平整、草坪种植、暖气调试等工作。甩项工作：屋面女儿墙陶土板、雨棚、纱窗、室外空调机组、地下室人防、路面恢复等收尾内容。

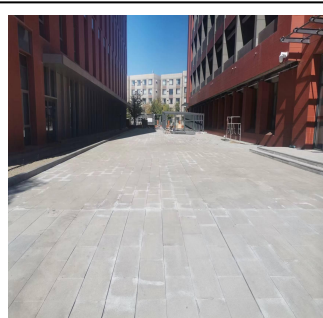

场地平整

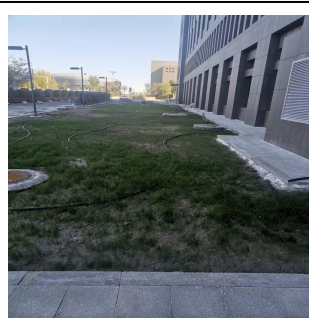

草坪种植



暖气调试

2. **C9 综合教学楼（政府代建）**：开工时间 **2021 年 3 月 22 日**，综合进度累计完成 **77%**。完成 1-5 层墙体抹灰工作；室内水暖电系统安装 60%；外墙干挂龙骨安装 80%。9 月 18 日克拉玛依职业技术学院启用 3 号大门，原文泽路施工通道拆除，计划将胜利路门作为施工进出通道。因防疫要求影响，项目自 9 月 20 日起处于停工状态。



二、完工项目回访工作

1. 3#学生餐厅：天圣公司完成 3#学生餐厅一层大厅卫生间和 7 号、8 号档口损坏的室外埋地排水管维修更换工作。

三、基本建设其他工作

1. 9 月 19 日，填报《中石大克校区 2023 年中央预算内投资计划申报表》发至克拉玛依市教育局高教科，明确校区关于财政贴息中长期贷款项目申报工作通过本部上报，校区不再单独申报。
2. 9 月 23 日，参加克拉玛依市政府投资建设项目代建中心组织的“C9 综合教学楼防疫通道搭设协调会”，明确由施工方搭设并维护物理隔离通道等 6 条内容。
3. 9 月 28 日，填报《中石大克校区-今明两年克拉玛依市本级新谋划重点项目前期费需求申请表》，发至克拉玛依市教育局高教科。
